

گزارش مالی مشارکت کننده

پروژه: آرشا 3

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

سرمایه‌گذار

هدیه خنجرى

واحد: نامشخص 

تاریخ قرارداد: ثبت نشده 

09127536593 

متراژ و موقعیت زمین : 573 متر مربع بصورت سه بر. (کوچه 12 متری و 14 متری و 16 متری)
ساختمان در ۶ طبقه مسکونی هر طبقه ۳ واحد (۱۸ واحدی) + 1 طبقه پارکینگ ساخته شده است.
واحدهای 115 متری دو خواب.

واحدهای 150 متری ۳ خواب با یک مستر و لاندري.

واحدهای 200 متری ۴ خواب با یک مستر و کلوزت.

ساختمان دارای سه لابی مجزا و دو آسانسور میباشد.

زیربنای کل 3721 متر مربع.

متراژ خالص واحدها 2790 متر مربع.

برآورد ریالی پروژه:

زمین متری 60.5 میلیون تومان (مجموعاً ۳۴.۷ میلیارد تومان) خریداری گردیده است.

سهم زمین متری ۱۳ میلیون تومان.

هزینه ساخت تا تحویل آپارتمان متری 31 میلیون تومان برآورد میگردد.

مجموع زمین + ساخت متری 46 میلیون تومان برآورد میگردد.

برآورد فروش متری 65 میلیون تومان در محاسبات سود در نظر گرفته شده است.

علاوه بر هزینه ساخت تا تحویل، هزینه اخذ پایان کار و سند متری 5 میلیون تومان برآورد میگردد که

بایستی پس از تحویل بصورت مرحله ای متناسب با پیشرفت کار توسط مالکین پرداخت گردد.

لازم به ذکر است با توجه به لزوم پرداخت هزینه ترانس برق و برش آسفالت جهت گازرسانی به پروژه، لازم

است کلیه مالکین تا حداکثر 10 اسفند نسبت به تامین مبلغ 60 میلیون تومان اقدام نمایند.

1405-03-31

تاریخ پایان پروژه

1402-05-16

تاریخ شروع پروژه

28,354,890,900

کل برداشت (تومان)

152,997,264,800

کل آورده (تومان)

3,968,004,200

کل مرجوعی (تومان)

124,642,373,900

کل سرمایه (تومان)

18

تعداد واحدها

128,349,502,210

برآورد کل هزینه خالص (تومان)

2,790

مجموع مترها مفید (متر مربع)

3,721

زیربنای کل (متر مربع)

11

تعداد مالک

37

تعداد مشارکت کنندگان

181,488,000,000

برآورد ارزش کل ساختمان (تومان)

26

تعداد سرمایه گذار

46,003,406

برآورد هزینه کل ساختمان (متری)

65,049,462

برآورد ارزش کل ساختمان (متری)

41.40%

نرخ سود کل

53,138,497,790

برآورد مبلغ کل سود ساختمان (تومان)

23.91%

نرخ سود سالانه

وضعیت فعلی پروژه ★



-

مانده صندوق فعلی (تومان)



-

هزینه خالص فعلی (تومان)

اطلاعات مالی مشارکت کننده

0

وام (تومان)

885,000,000

آورده نقدی (تومان)

270,000,000

کل برداشت (تومان)

885,000,000

مجموع آورده (تومان)

383,364,584

کل سود مشارکت (تومان)

615,000,000

سرمایه موجود (تومان)

0.49%

نسبت سرمایه به سرمایه کل

998,364,584

سرمایه+سود مشارکت (تومان)

0.56%

نسبت (سرمایه+سود) به کل

0.72%

نسبت سود به سود کل

-

شاخص نفع

65,049,462


میانگین وزنی قیمت هر متر ساختمان (تومان/متر مربع)

15.348

مالکیت محاسبه شده (متر مربع)


تند سرمایه موجود و هزینه واحد

پروژه: آرشا 3 - تند سرمایه موجود و هزینه واحد

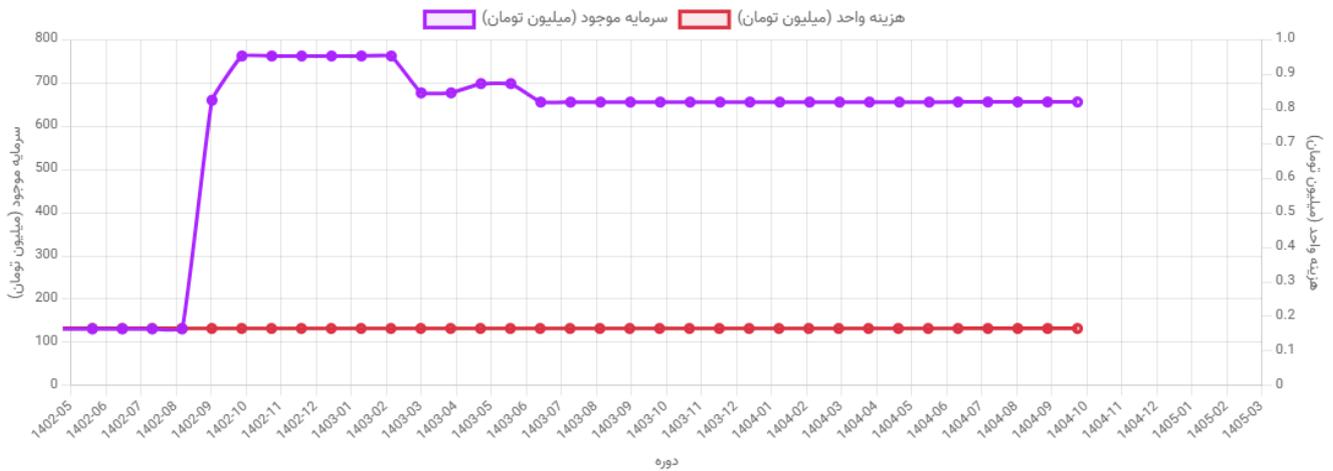


رشد تراکنش‌های آورده و برداشت

پروژه: آرشا 3 - رشد تراکنش‌های آورده و برداشت

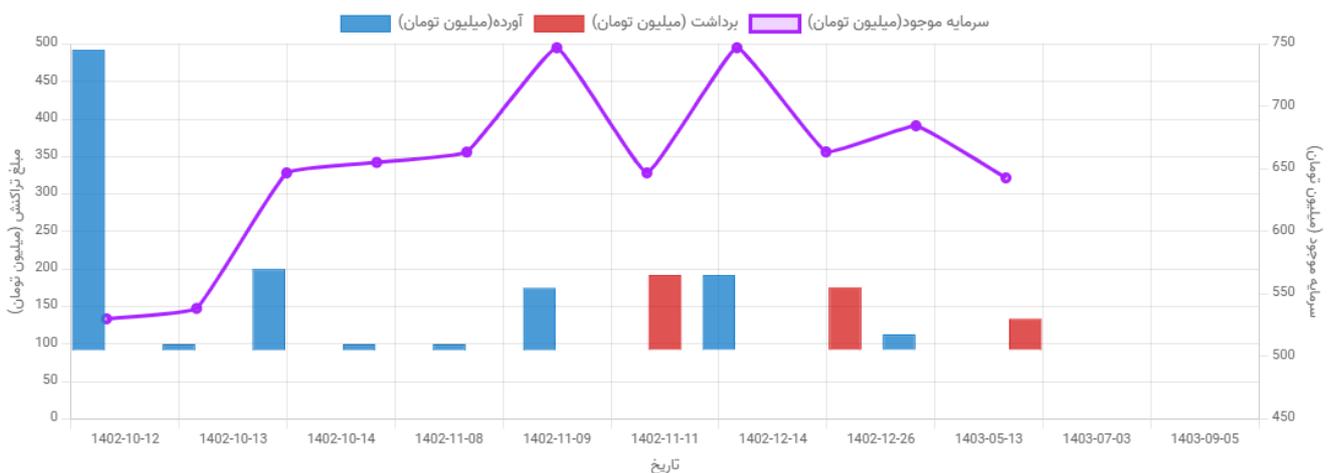

نمودار ماهانه آورده، برداشت و سرمایه موجود

پروژه: آرشا 3 - نمودار ماهانه آورده، برداشت و سرمایه موجود

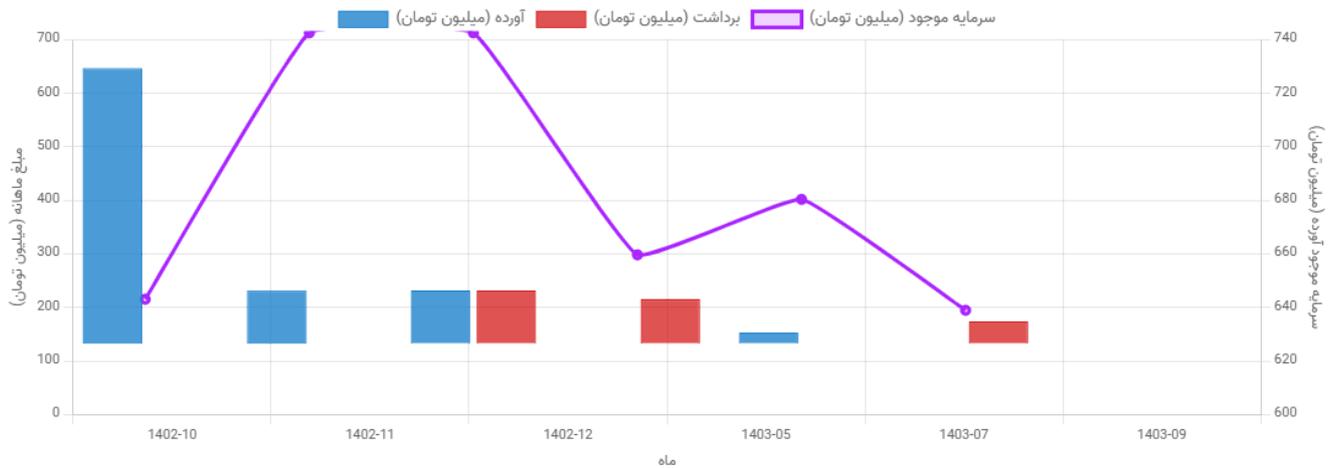

توزیع تراکنش‌ها

پروژه: آرشا 3



لیست تراکنش‌های مالی

ردیف	تاریخ	نوع تراکنش	مبلغ (تومان)	سود مشارکت (تومان)	توضیحات
1	1402-10-12	آورده	480,000,000	285,796,191	آورده خانم هدیه خنجرى- 2 فقره چک و نقد
2	1402-10-13	آورده	10,000,000	5,947,479	آورده خانم هدیه خنجرى- واریز به حساب بهروزی
3	1402-10-14	آورده	130,000,000	77,231,319	آورده خانم هدیه خنجرى- واریز به حساب آزاد و میرعابدینی

ردیف	تاریخ	نوع تراکنش	مبلغ (تومان)	سود مشارکت (تومان)	توضیحات
4	1402-11-08	آورده	10,000,000	5,782,271	آورده خانم هدیه خنجرى-تجارت شاهینی
5	1402-11-09	آورده	10,000,000	5,775,663	آورده خانم هدیه خنجرى-تجارت شاهینی
6	1402-11-11	آورده	100,000,000	57,624,463	آورده خانم هدیه خنجرى-کارت اعتباری
7	1402-12-14	برداشت	120,000,000	66,532,465	خروج از سرمایه خانم هدیه خنجرى
8	1402-12-26	آورده	120,000,000	65,580,868	آورده خانم هدیه خنجرى
9	1403-05-13	برداشت	100,000,000	45,399,090	خروج از سرمایه خانم هدیه خنجرى
10	1403-07-03	آورده	25,000,000	10,490,692	آورده خانم هدیه خنجرى- واریز به حساب خانم چال لو
11	1403-09-05	برداشت	50,000,000	18,932,808	خروج از سرمایه خانم هدیه خنجرى- آورده کاشانی
