

گزارش مالی مشارکت کننده

پروژه: آرشا 3

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

سرمایه‌گذار

محمد رضا منتظری

واحد: نامشخص 

تاریخ قرارداد: ثبت نشده 

09128510564 

متراژ و موقعیت زمین : 573 متر مربع بصورت سه بر. (کوچه 12 متری و 14 متری و 16 متری)
ساختمان در ۶ طبقه مسکونی هر طبقه ۳ واحد (۱۸ واحدی) + 1 طبقه پارکینگ ساخته شده است.
واحدهای 115 متری دو خواب.
واحدهای 150 متری ۳ خواب با یک مستر و لاندری.
واحدهای 200 متری ۴ خواب با یک مستر و کلوزت.
ساختمان دارای سه لابی مجزا و دو آسانسور میباشد.
زیربنای کل 3721 متر مربع.
متراژ خالص واحدها 2790 متر مربع.
برآورد ریالی پروژه:
زمین متری 60.5 میلیون تومان (مجموعاً ۳۴.۷ میلیارد تومان) خریداری گردیده است.
سهم زمین متری ۱۳ میلیون تومان.
هزینه ساخت تا تحویل آپارتمان متری 31 میلیون تومان برآورد میگردد.
مجموع زمین + ساخت متری 46 میلیون تومان برآورد میگردد.
برآورد فروش متری 65 میلیون تومان در محاسبات سود در نظر گرفته شده است.

علاوه بر هزینه ساخت تا تحویل، هزینه اخذ پایان کار و سند متری 5 میلیون تومان برآورد میگردد که بایستی پس از تحویل بصورت مرحله ای متناسب با پیشرفت کار توسط مالکین پرداخت گردد.

لازم به ذکر است با توجه به لزوم پرداخت هزینه ترانس برق و برش آسفالت جهت گازرسانی به پروژه، لازم است کلیه مالکین تا حداکثر 10 اسفند نسبت به تامین مبلغ 60 میلیون تومان اقدام نمایند.

1405-03-31 تاریخ پایان پروژه	1402-05-16 تاریخ شروع پروژه
28,354,890,900 کل برداشت (تومان)	152,997,264,800 کل آورده (تومان)
3,968,004,200 کل مرجوعی (تومان)	124,642,373,900 کل سرمایه (تومان)
18 تعداد واحدها	128,349,502,210 برآورد کل هزینه خالص (تومان)
2,790 مجموع مترها مفید (متر مربع)	3,721 زیربنای کل (متر مربع)
11 تعداد مالک	37 تعداد مشارکت کنندگان
181,488,000,000 برآورد ارزش کل ساختمان (تومان)	26 تعداد سرمایه گذار
46,003,406 برآورد هزینه کل ساختمان (متری)	65,049,462 برآورد ارزش کل ساختمان (متری)
41.40% نرخ سود کل	53,138,497,790 برآورد مبلغ کل سود ساختمان (تومان)

23.91%
نرخ سود سالانه

وضعیت فعلی پروژه ★

مانده صندوق فعلی (تومان) -	هزینه خالص فعلی (تومان) -
-------------------------------	------------------------------

اطلاعات مالی مشارکت کننده

وام (تومان) 0	آورده نقدی (تومان) 116,000,000
کل برداشت (تومان) 116,000,000	مجموع آورده (تومان) 116,000,000
کل سود مشارکت (تومان) 1,816,624	سرمایه موجود (تومان) 0
نسبت سرمایه به سرمایه کل 0.00%	سرمایه+سود مشارکت (تومان) 1,816,624
نسبت (سرمایه+سود) به کل 0.00%	نسبت سود به سود کل 0.00%
	شاخص نفع -

65,049,462


میانگین وزنی قیمت هر متر ساختمان (تومان/متر مربع)

0.028

مالکیت محاسبه شده (متر مربع)


تند سرمایه موجود و هزینه واحد

پروژه: آرشا 3 - تند سرمایه موجود و هزینه واحد

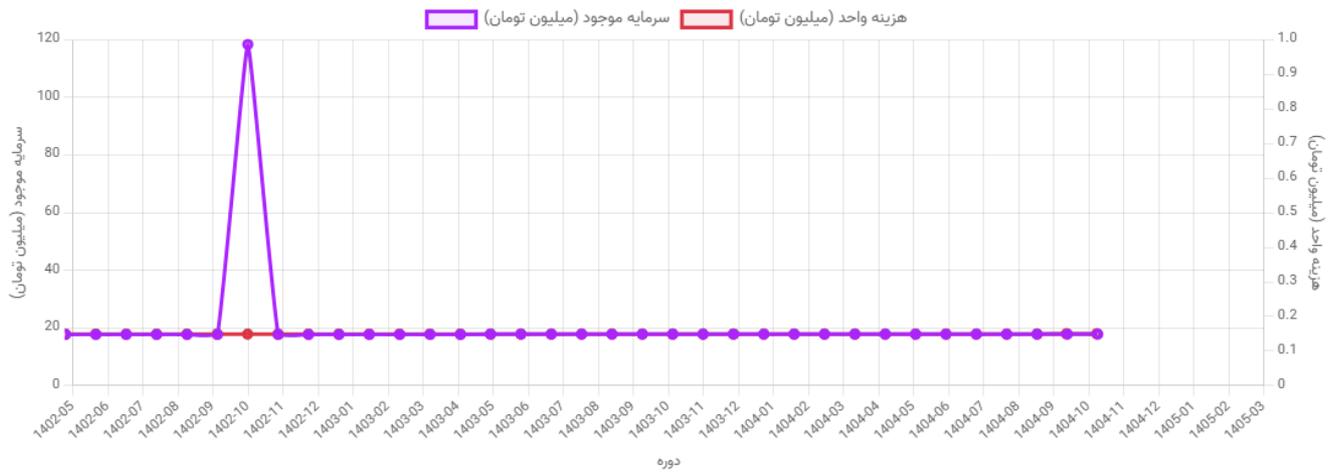


رشد تراکنش‌های آورده و برداشت

پروژه: آرشا 3 - رشد تراکنش‌های آورده و برداشت

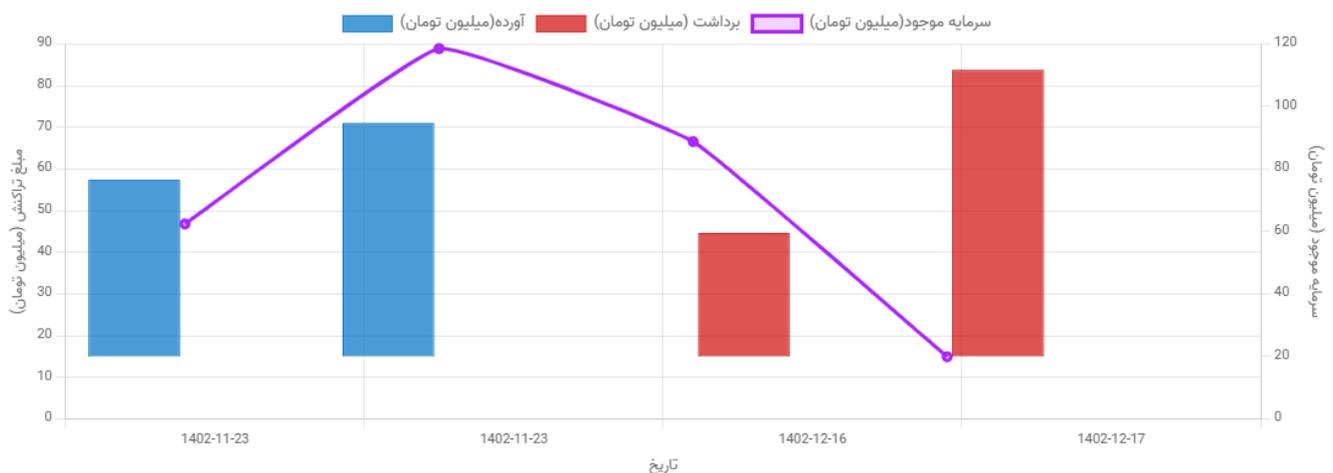


📊 نمودار ماهانه آورده، برداشت و سرمایه موجود

پروژه: آرشا 3 - نمودار ماهانه آورده، برداشت و سرمایه موجود

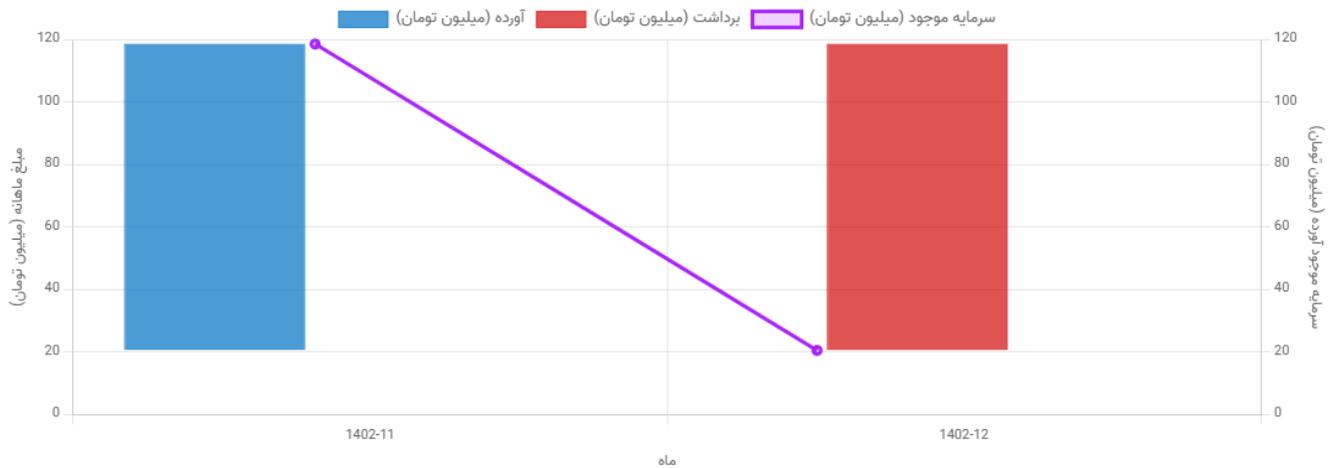

📊 توزیع تراکنش‌ها

پروژه: آرشا 3

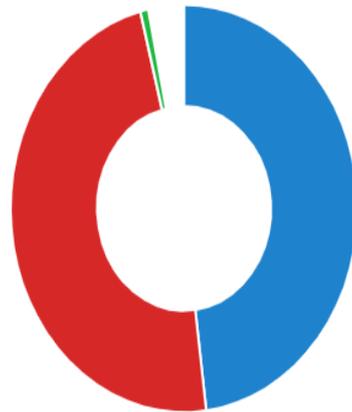

آورده
برداشت
سود مشارکت

☰ لیست تراکنش‌های مالی

ردیف	تاریخ	نوع تراکنش	مبلغ (تومان)	سود مشارکت (تومان)	توضیحات
1	1402-11-23	آورده	50,000,000	28,415,733	آقای محمد رضا منتظری- میرعابدینی
2	1402-11-23	آورده	66,000,000	37,508,768	آقای محمد رضا منتظری- ملت 44
3	1402-12-16	برداشت	35,000,000	19,359,044	خروج از سرمایه آقای محمد رضا منتظری- سپه
4	1402-12-17	برداشت	81,000,000	44,748,832	خروج از سرمایه آقای محمد رضا منتظری- سپه
