

گزارش مالی مشارکت کننده

پروژه: آرشا 3

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۹/۷

سرمایه‌گذار

علیرضا کاشانی

واحد: نامشخص

تاریخ قرارداد: ثبت نشده

09127571709

توضیحات پروژه

مترائ و موقعیت زمین : 573 متر مربع بصورت سه بر. (کوچه 12 متری و 14 متری و 16 متری)
ساختمان در ۶ طبقه مسکونی هر طبقه ۳ واحد (۱۸ واحدی) + 1 طبقه پارکینگ ساخته شده است.
واحدهای 115 متری دو خواب.
واحدهای 150 متری ۳ خواب با یک مستر و لاندري.
واحدهای 200 متری ۴ خواب با یک مستر و کلوزت.
ساختمان دارای سه لابی مجزا و دو آسانسور میباشد.
زیربنای کل 3721 متر مربع.
مترائ خالص واحدها 2790 متر مربع.
برآورد ریالی پروژه:
زمین متری 60.5 میلیون تومان (مجموعاً ۳۴.۷ میلیارد تومان) خریداری گردیده است.
سهم زمین متری ۱۳ میلیون تومان.
هزینه ساخت تا تحویل آپارتمان متری 31 میلیون تومان برآورد میگردد.
مجموع زمین + ساخت متری 44 میلیون تومان برآورد میگردد.
برآورد فروش متری 60 میلیون تومان در محاسبات سود در نظر گرفته شده است.
علاوه بر هزینه ساخت تا تحویل، هزینه اخذ پایان کار و سند متری 4 میلیون تومان برآورد میگردد که
بایستی پس از تحویل بصورت مرحله ای متناسب با پیشرفت کار توسط مالکین پرداخت گردد.

1405-05-31 تاریخ پایان پروژه	1402-05-16 تاریخ شروع پروژه
22,614,890,900 کل برداشت (تومان)	133,295,364,500 کل آورده (تومان)
3,865,004,500 کل مرجوعی (تومان)	110,680,473,600 کل سرمایه (تومان)
18 تعداد واحدها	123,002,741,330 برآورد کل هزینه خالص (تومان)
2,790 مجموع مترائ مفید (متر مربع)	3,721 زیربنای کل (متر مربع)
12 تعداد مالک	39 تعداد مشارکت کنندگان
167,448,000,000 برآورد ارزش کل ساختمان (تومان)	27 تعداد سرمایه گذار
44,087,004 برآورد هزینه کل ساختمان (متری)	60,017,204 برآورد ارزش کل ساختمان (متری)
36.13% نرخ سود کل	44,445,258,670 برآورد مبلغ کل سود ساختمان (تومان)

18.38%

نرخ سود سالانه

★ وضعیت فعلی پروژه



536,732,270

مانده صندوق فعلی (تومان)



110,143,741,330

هزینه خالص فعلی (تومان)

اطلاعات مالی مشارکت کننده

0

آورده وام (تومان)

3,500,000,000

آورده نقدی (تومان)

0

کل برداشت (تومان)

3,500,000,000

مجموع آورده (تومان)

1,049,648,788

کل سود (تومان)

3,500,000,000

سرمایه موجود (تومان)

3.16%

نسبت سرمایه به سرمایه کل

4,549,648,788

سرمایه+سود مشارکت (تومان)

2.93%

نسبت (سرمایه+سود) به کل

2.36%

نسبت سود به سود کل

شاخص نفع

مالکیت محاسبه شده

60,017,204


میانگین وزنی قیمت هر متر ساختمان (تومان/متر مربع)

75.806

مالکیت محاسبه شده (متر مربع)


تrends of Existing Capital and Unit Cost

پروژه: آرشا 3 - روند سرمایه موجود و هزینه واحد

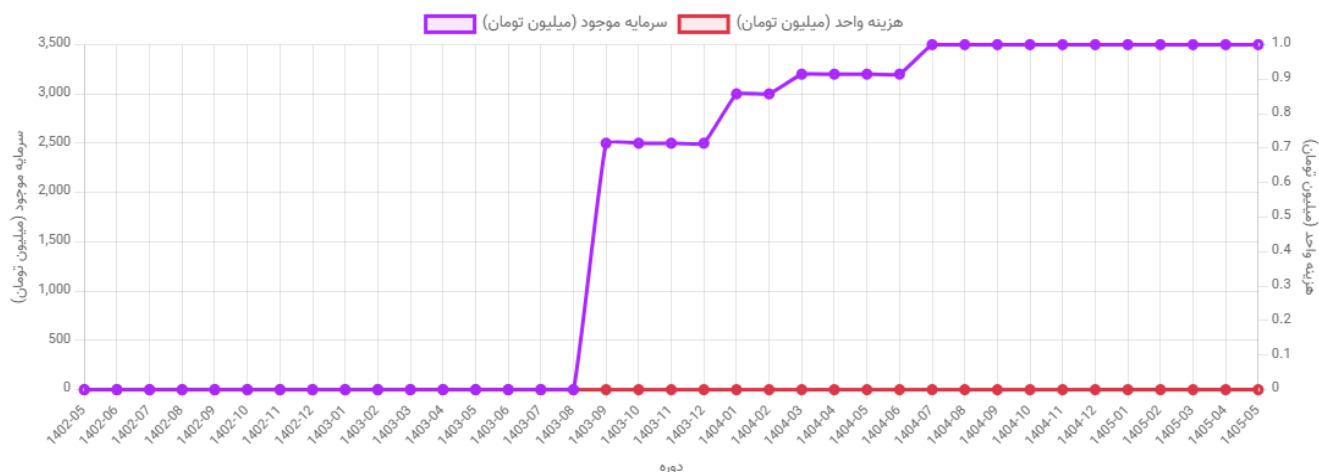


Trends of Revenue and Existing Capital

پروژه: آرشا 3 - روند تراکنش‌های آورده و برداشت

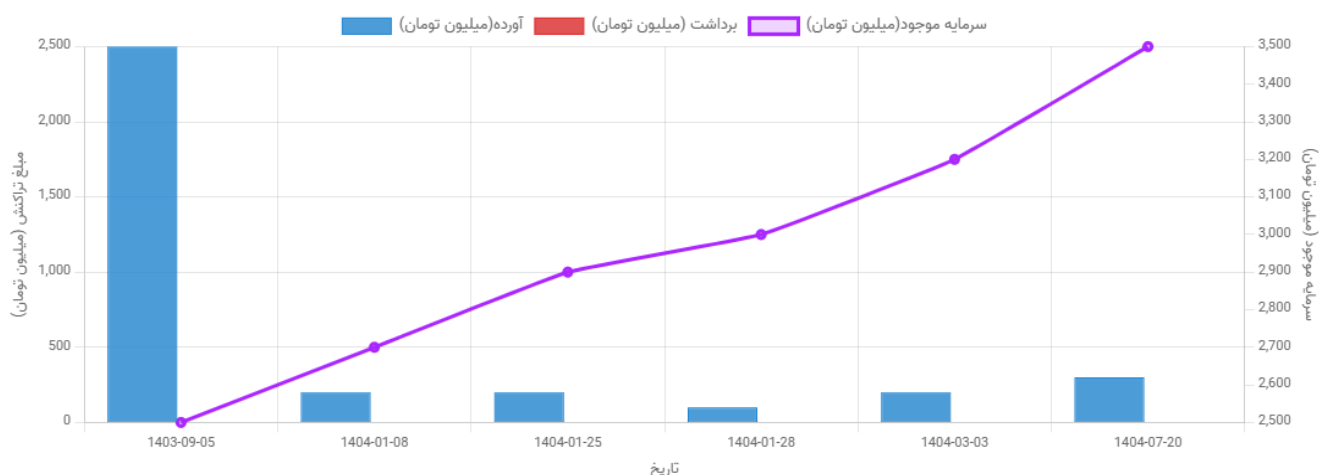

نمودار ماهانه آورده، برداشت و سرمایه موجود

پروژه: آرشا 3 - نمودار ماهانه آورده، برداشت و سرمایه موجود

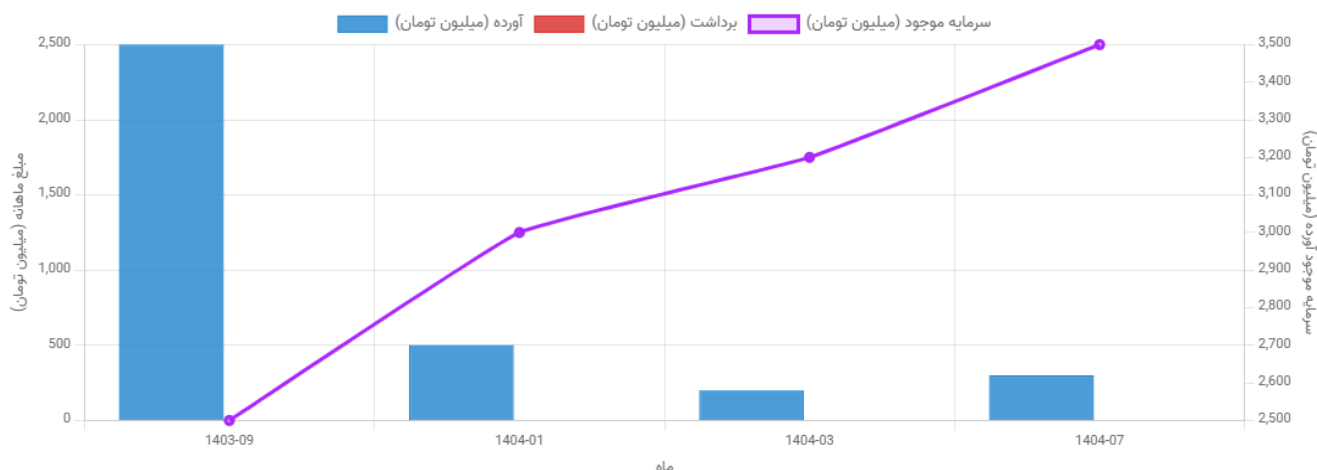

توزیع تراکنش‌ها

پروژه: آرشا 3



لیست تراکنش‌های مالی

ردیف	تاریخ	نوع تراکنش	مبلغ (تومان)	توضیحات
1	1403-09-05	سود مشارکت	823,564,203	سود محاسبه شده برای آورده 25000000000.00
2	1403-09-05	آورده	2,500,000,000	آورده آقای علیرضا کاشانی- سپه
3	1404-01-08	سود مشارکت	53,123,133	سود محاسبه شده برای آورده 200000000.00
4	1404-01-08	آورده	200,000,000	آورده آقای علیرضا کاشانی. 2 فقره چک 8 فروردین

ردیف	تاریخ	نوع تراکنش	مبلغ (تومان)	توضیحات
5	1404-01-25	سود مشارکت	51,359,279	سود محاسبه شده برای آورده 200000000.00
6	1404-01-25	آورده	200,000,000	آورده آقای علیرضا کاشانی. چک 30 فروردین
7	1404-01-28	سود مشارکت	25,524,006	سود محاسبه شده برای آورده 100000000.00
8	1404-01-28	آورده	100,000,000	آورده آقای علیرضا کاشانی. چک 15 اردیبهشت
9	1404-03-03	سود مشارکت	47,209,035	سود محاسبه شده برای آورده 200000000.00
10	1404-03-03	آورده	200,000,000	آورده آقای علیرضا کاشانی- تجارت 27
11	1404-07-20	سود مشارکت	48,869,133	سود محاسبه شده برای آورده 300000000.00
12	1404-07-20	آورده	300,000,000	آورده آقای علیرضا کاشانی- تجارت 11
